УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Дата происшествия	07 июля 2022 г	**3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая** 1. Довести обстоятельства несчастного случая до работников ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» 2. Провести внеплановый инструктаж по охране труда электротехническому и электротехнологическому персоналу ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС». 3. Провести внеочередную проверку знаний по охране труда начальнику управления эксплуатации инженерных сетей. и начальнику отдела главного энергетика. 4. Провести внеочередную проверку знаний правил работы в электроустановках с подтверждением группы по электробезопасности в территориальном управлении Ростехнадзора начальнику управления эксплуатации инженерных сетей и начальнику отдела главного энергетика. 5. Незамедлительно усилить контроль за фактическим отработанным временем ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС». 6. Обеспечить ведение журнала выдачи и возврата ключей электроустановок.
Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» (далее – ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС»)	
Место несчастного случая	г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.100, корпус № 2, общий коридор подвального помещения между помещением №130 и №131в	
Вид происшествия	Поражение электрическим током	
Краткое описание несчастного случая 20.06.2022 в ООО «РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС» от арендатора поступило заявление на установку счетчика электрической энергии в арендуемом им помещении № 131в, расположенном в подвале корпусе №2 по адресу: ул. Интернациональная, 100. 07.07.2022 в 16:14 для выполнения заявки арендатора пострадавший электромонтер по обслуживанию и ремонту распределительных сетей, совместно с начальником отдела главного энергетика, направились во 2 корпус в помещение №131в для определения плана работ и наличия необходимых материалов, часть которых должен был приобрести арендатор.. В связи с тем, что арендатор не смог предоставить недостающих материалов для выполнения работ, на месте работ было принято совместное решение между арендатором и начальником отдела главного энергетика - без подключения кабеля к электрической сети выполнить часть электромонтажных (подготовительных) работ из имеющихся материалов, а именно: смонтировать на стене бокс с автоматическими выключателями и счетчиком электрической энергии, проложить электрический кабель от бокса до силового распределительного щита ЩС 380/220В. После выдачи устного задания начальник отдела главного энергетика и арендатор покинули помещение, электромонтер остался выполнять работы. 07.07.2022 в 22 часа 40 минут, очевидец несчастного случая, выходя из соседнего помещения в коридор обнаружил электромонтера по обслуживанию и ремонту распределительных сетей в положении лежа на боку в ЩС 380/220В, без признаков жизни, и направился на контрольно-пропускной пункт (КПП), где сообщил об увиденном сотрудникам частного охранного предприятия (далее – ЧОП). 08.07.2022, в 00 часов 30 минут, в ходе осмотра места происшествия выявлено: электромонтер по обслуживанию и ремонту распределительных сетей, выполнив все		

монтажные работы, приблизился головой на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЩС 380/220В находящимся под напряжением и из-за прикосновения к ним, получил поражение техническим электричеством. Причины несчастного случая 1. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в том, что электромонтер по обслуживанию и ремонту распределительных сетей, не поставив в известность непосредственного руководителя про намерения выполнять работы в действующей электроустановке расширил рабочее место, приступил единолично к проведению работ под напряжением в электроустановке, то есть без ее отключения и не используя СИЗ, нарушив при этом: Статью 215 ТК РФ; Пункты 2.4., 4.1., 4.2., 4.6., 4.8. ПОТЭЭ; Пункт 3.1.1, 4.1.1., 5.1 ПИ-5411.1.00.22; Пункт 2.14, 2.16, 2.17, 3.1, ИОТ; Пункт 1.7, 2.14, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8. ДИ-4121. 2. Ответственный за электрохозяйство, начальник отдела главного энергетика, не в полном объеме организовал осуществление электромонтажных работ электромонтером по обслуживанию и ремонту сетей, и контроль за выполнением сменных заданий работником участка электроснабжения, что является нарушением ст. 214 ТК РФ, пунктов 2.6, 2.12, 2.36, 2.37, пунктов 6.6., 8.6. ПОТЭЭ и пункт 1.2.6 ПТЭЭП; 3. Начальник управления инженерных сетей не в полном объеме обеспечил выполнение подчиненными работниками, начальником отдела главного энергетика и электромонтером по обслуживанию и ремонту сетей, должностных инструкций, производственных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по эксплуатации, что является нарушением ст. 214 ТК РФ, п. 2.22 и 2.23 и П. 1.2.2. ПТЭЭП;	

4. Фото и схема места происшествия

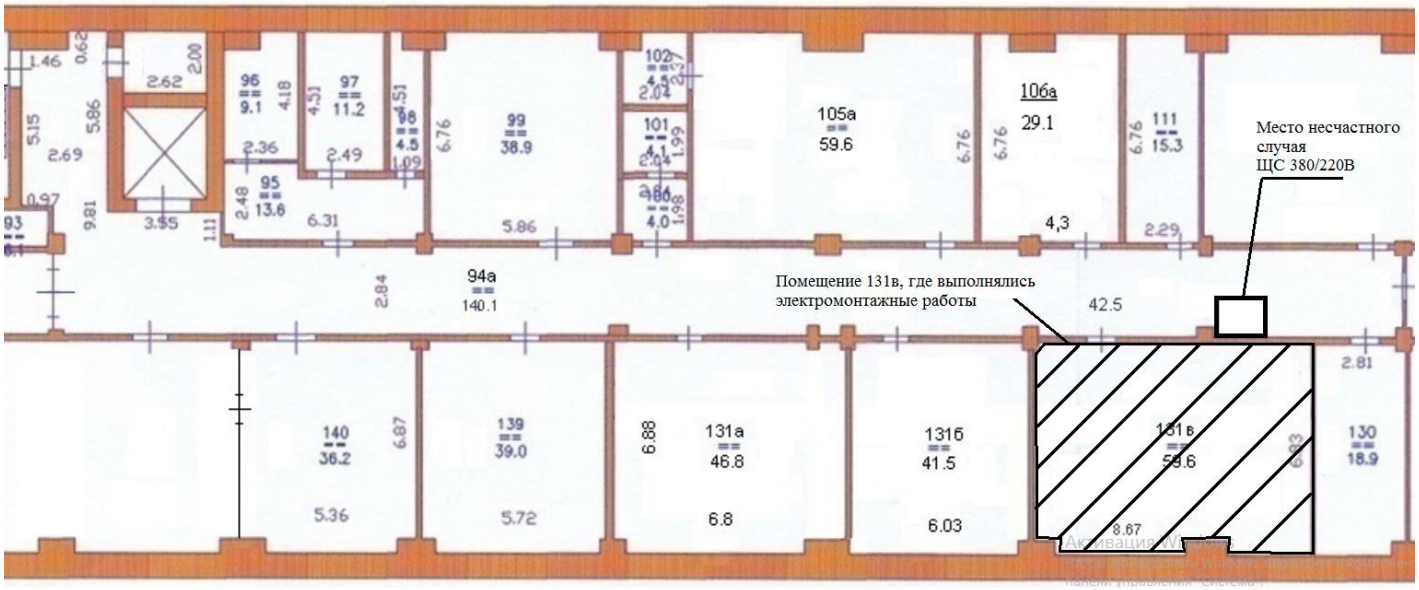

30A
